哲銘的 Lesson Learned

工作歷程反思 · 知識傳承 · 給下一位的提醒

20260630



Part 1

通用 Lesson Learned

01 核心理念

02 專案管理鐵三角

03 角色定位

04 制度與知識資產

01 核心理念

管理工作的本質：

定義清楚工作標準與驗收標準，維持各方的遊戲規則 ，讓大家順利結案，共享成果。



自我檢驗

身兼甲乙方，不因雙重角色而放水，反而需更嚴格審視自己的產出品質



整合意見

匯集建築師、承包商、建經、地主等各方聲音，找出共識推動決策



提出關鍵看法

不只是傳話筒，要能獨立判斷、表態，成為推動決策的關鍵角色

01 補充

完工檢核點：AC 與 DOD 的區別(品質的內驗外確)

驗收標準（AC）是最低門檻；完工定義（DOD）是團隊品質承諾，兩者缺一不可

AC

Acceptance Criteria

Scope：針對單一使用者故事
(User Story Specific)

Owner：
由利害關係人/PO 負責定義

DOD

Definition of Done

Scope：針對整個疊代
(Iteration Specific)

Owner：
團隊共同定義

02

專案管理鐵三角

範疇不定，時程跟成本也不可能定 → Scope 是根，其他二者是果。

範疇 Scope

最關鍵

時程 Schedule

依範疇而定

成本 Cost

依範疇而定

02 補充

專案管理計畫：三個基準線（Baseline）

基準線是專案控管的尺——唯有先定義基準，才能衡量偏差、啟動變更流程

範疇基準

Scope Baseline

- 範疇說明書、WBS 及 WBS 字典的核准版本
- 只能透過正式變更控制程序進行更改
- 成為比較的基準

時程基準

Schedule Baseline

- 時程模型的核准版本
- 被適當利害關係人接受並批准
- 具有基準起始日及基線完成日
- 監控期間與實際日期比較確認差異

成本基準

Cost Baseline

- 經過核准的分期(time-phased)預算版本
- 不包括任何管理儲備
- 只能通過正式變更控制程序更改
- 根據不同時程活動批准預算總和制定

01 補充　專案管理計畫的用途

請各位至少先了解如何製作專案管理計畫！



引導專案的執行

提供清晰的執行方向與框架，確保所有成員依循同一套計畫推動工作



記錄假設與備選方案決策過程

記錄規劃時的假設條件，以及各備選方案的評估與決策依據



促進關係人的溝通

作為各方關係人溝通的共同基礎，降低資訊落差與誤解



定義管理審查內容與時機

明確規範何時、由誰、審查什麼，建立管理節點



建立績效評估基準

與三個 Baseline 連結，作為衡量偏差與判斷是否需要變更的依據

02

在家騰我覺得最重要的三件事



圖面定案

圖沒定，招標/估價/執照全卡住
都更類型尤其嚴重，牽一髮動全身



構型管制

版本控制，控管在外流通圖面
建設公司主責發行，事務所主責源頭品質
出圖規則需明文化，不得妥協



議題管理

遇事先記錄、定期回顧
面對地主/承辦/複委託/老闆等多方
人忙易忘，Google Sheet 是基礎工具

02

構型管制：出圖規則（不得妥協的三條線）

建設公司：當責圖面的發行與傳遞　|　建築師事務所：當責圖面的品質與版本（源頭）

1

圖面性質標示

請於圖面內或至少檔案名稱中，明確標示為「發行圖」或「參考圖」，確保流通圖面性質清晰。

2

日期 · 出圖章 · （無商量空間）

無論發行圖或參考圖，日期欄必填發行日期；正式發行圖須加蓋出圖章，並標示設計者及審核者。此點沒有討論空間，請務必遵守。**折衷辦法就是自己蓋收發章確定圖的日期及版本。**


3

正式發行程序（雙重確認）

正式發行除電子檔傳送外，必須另以備文方式正式發送，且需雙方簽收，始為完成文件遞送。

02 補充

議題處置工作流（Issue Resolution Flowchart）

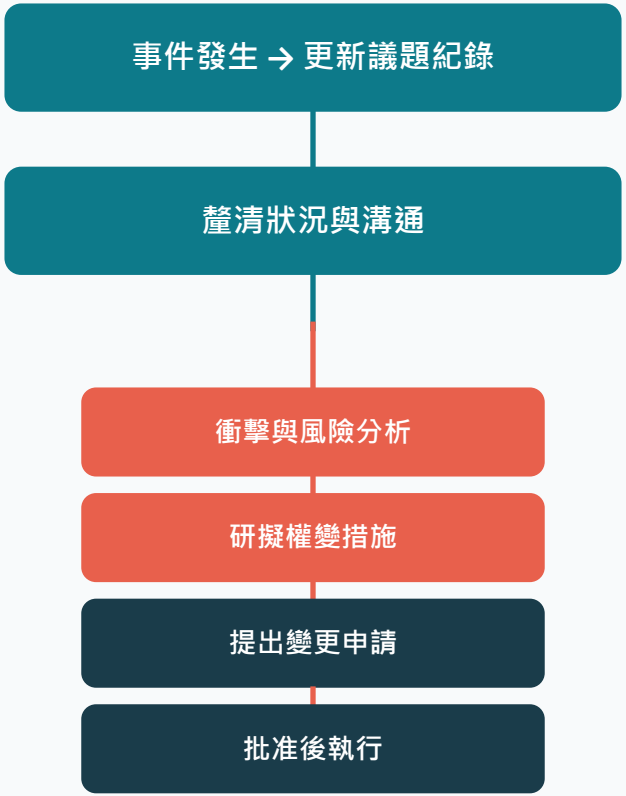

直接執行應變計畫

03 角色定位：甲乙方雙重身份

背景：原為建設公司專案；因聯合大樓施工在即，同時承擔建築師事務所圖面修正等工作，形成甲乙方合一的特殊角色



優點

- 掌握全局資訊，不受單一視角限制
- 溝通成本顯著降低
- 決策效率提升，資訊不失真



挑戰

- 責任劃分容易模糊不清
- 甲乙方視角難以自由切換
- 自我審查機制容易失效



給接手者的提醒：這個角色需要「自我檢驗、整合意見、提出關鍵看法」三種能力並用。
責任模糊的地方，要主動釐清，而不是讓它繼續模糊。

團隊發展軌跡與情境式領導 (Situational Leadership)



04 制度與知識資產

以下為本職務核心的制度工具，細節請參閱附件或由口頭補充說明。

卷宗目錄公版

都更案件標準文件架構

- 基本分析（位置圖、地籍圖、建築線…）
- 產能與投報（面積表、投報分析…）
- 前期開發（地主訪談、座談會…）
- 設計簽約（合約、分坪表…）
- 都更送件準備（事業計畫、時程表…）

都更 SOP 流程圖

從可行性評估到審議核定

- 可行性評估 → 意願調查
- 座談會規劃與執行
- 事業計畫書送件
- 公聽會流程（14日前通知）
- 審議 → 核定
